

Universitäres Tierhospital Zürich  
Stabilisierende Massnahmen  
Pferdeklinik

Etappierungskonzept & Termine  
Baustart

# 1. Etappe Bau


- Erstellen von provisorischen Pferdeboxen (6 Aussenboxen) inkl. Vorbereiten des Untergrundes und der prov. Entwässerung
- Versetzen des Vetsuisse-Containers vor den Raum TOP-00-01 zur Nutzung als Lagercontainer inkl. Vorbereiten des Untergrundes
- Ertüchtigung des Raumes TOP-00-01 (insbesondere Dichtigkeit und Entwässerung des Bodens und prov. Einbau eines Untersuchungsstandes)
- Rückbau der ehemaligen Greifvogelvoliere und Beginn der Baustelleninstallation



Nutzergespräche mit der Besprechung des detaillierten Bauablaufs werden Mitte / Ende März erfolgen, nach den Startsitungen mit den Unternehmern.

# 1. Etappe Umzug

- Pferdemedizin bezieht prov. Aussenboxen und Raum TOP-00-01 als prov. Untersuchungsraum inkl. Lagermöglichkeit im Vetsuisse-Container

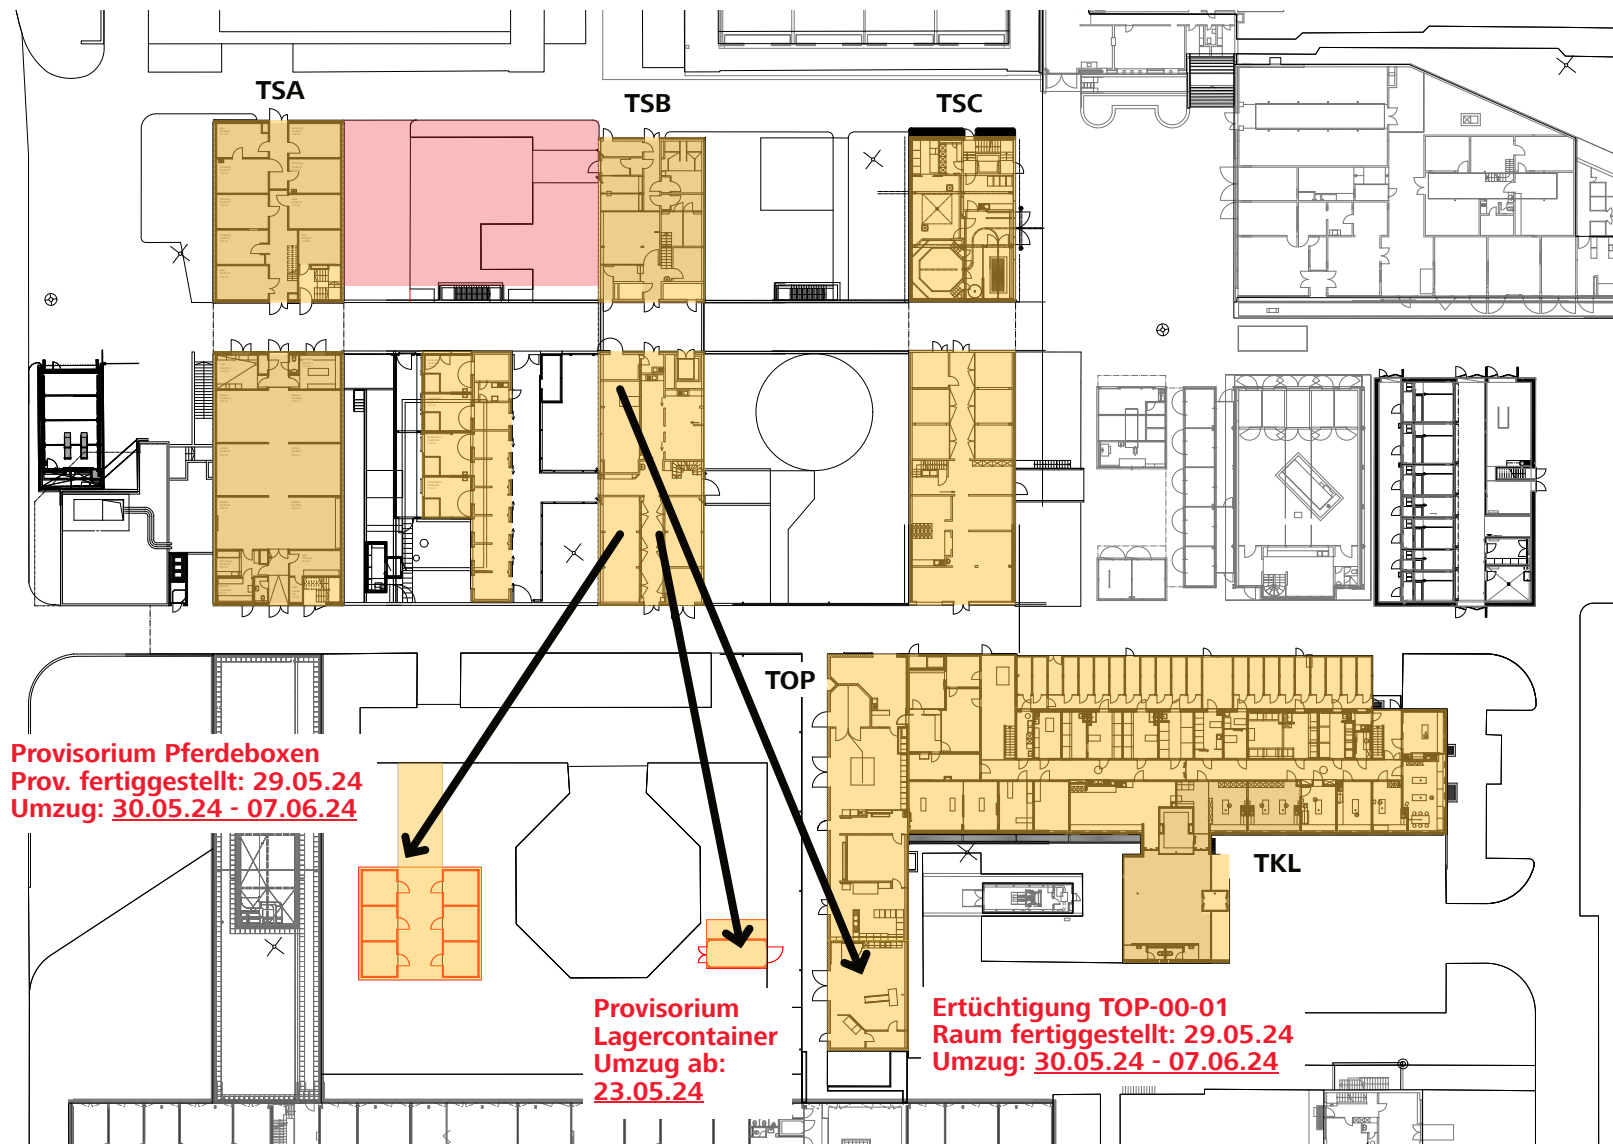

## 2. Etappe Bau

- Umbau und Stabilisierung des Gebäudes TSB inkl. den Büroräumen im Unter- und Obergeschoss

